


LOCAL | Infraestructuras

El nivel de ejecución de las obras de la variante de Las Angosturas supera el 40%

El próximo lunes entrará en servicio un desvío provisional en el primer tramo de la obra, para llevar a cabo los trabajos de conexión con las intersecciones de Fuente Tójar y Castil de Campos.

Rafael Cobo Calmaestra

Miércoles 22 de marzo de 2023 - 17:38

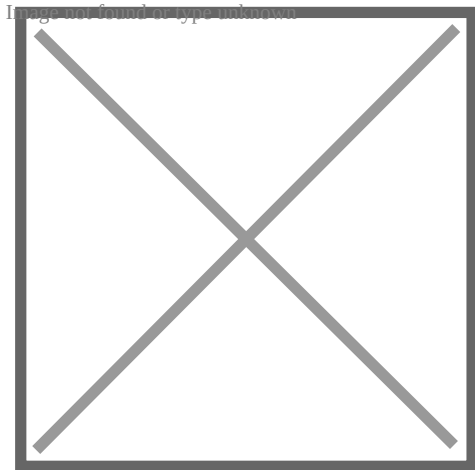

La delegada de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Cristina Casanueva, giraba hoy miércoles una visita a las obras de construcción de un desvío provisional en la A-333, que permitirá llevar a cabo los trabajos de conexión del tramo inicial de la variante de Las Angosturas con el entronque de las intersecciones con Fuente Tójar y Castil de Campos.

Como indicaba Casanueva, “mañana jueves comenzará el asfaltado de dicho desvío, de 410 metros de longitud y 7 metros de ancho, estando previsto que se abra al tráfico el próximo lunes, una vez se proceda su señalización”. En este sentido, la delegada solicitaba precaución cuando se transite por este punto, ya que habrá

circulación de vehículos pesados, produciéndose igualmente cortes intermitentes de poca duración pero que ralentizarán la circulación en este tramo, en el que se ha limitado la velocidad a 40 kilómetros por hora.

En cuanto al estado de ejecución de las obras de la variante, la delegada afirmaba que van “a buen ritmo”, agradeciendo a las empresas adjudicatarias de que todo vaya en plazo y que en estos momentos la ejecución total supere el 40%.

En este sentido, la delegada indicaba que ya están ejecutadas, “más del 70% ejecutado de explanaciones, más del 47% de drenajes, y más del 32% todo lo que tiene que ver con las estructuras”, destacando dentro de éstas el viaducto de 112 metros de longitud sobre el río Salado, que será una de las infraestructuras más importantes de la variante.

Igualmente, Casanueva indicaba que 1,5 kilómetros de la obra ese están viendo afectados por la parada biológica que coincide con el periodo de nidificación del águila perdicera, pese a lo cual, como añadía, “se está trabajando a buen ritmo en el resto de zonas”, indicando que de manera paralela se está tramitando todo lo relacionado con el modificado del trayecto a consecuencia de la aparición del yacimiento arqueológico.

Por otra parte, la delegada quiso aclarar las dudas que en los últimos días se están generando en relación con el pago de las expropiaciones de los terrenos afectados por la variante, indicando que las expropiaciones, “tienen sus plazos legales”.

En este sentido Casanueva recordaba que en 2010, “hubo familias a las que se les realizó un pago, como depósito previo, lo que permite a la administración poder hacer uso de los terrenos”, señalando que ahora, “estamos trabajando con los mutuos acuerdos, para lo que está llamando a las familias afectadas y ajustando la expropiación, valorándose desde el cultivo que tenía, los metros exactos y la cantidad que se les abonará”. Independientemente de ello, la delegada añadía que esas familias, “podrán solicitar, una vez que se firme el

mutuo acuerdo y se les haga el ingreso, los atrasos que ha tenido la administración por no haber ejecutado la obra desde 2010 cuando se hicieron los primeros depósitos previos”.

Por último, Casanueva incidía en que la obra, “está siendo un poco compleja, porque hemos tenido varias modificaciones, principalmente el yacimiento arqueológico, que han hecho que, a personas que se ha expropiado, tengamos ahora que hacer modificaciones, ampliaciones y reajustas en algunas zonas”.
